



GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

2020 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

Mart 2021

1. Genel Değerlendirme

1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları:

Üniversitemiz 5018 sayılı Kanuna ekli II sayılı cetvelde sayılan ve hazine yardımı alan özel bütçeli bir kamu idaresi olup yatırımlarını hazine yardımı ile finanse etmektedir.

1.2. Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi:

03.07.1992 tarihli ve 3837 sayılı Kanunun 25 inci maddesine göre kurulan Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 21.10.2014 tarihli ve 6562 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile teşkilat yapısı değişerek Gebze Teknik Üniversitesi adını almış olup 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 12 nci maddesinde yer alan görevleri yerine getirmek üzere faaliyette bulunmaktadır.

- Üniversitemiz kuruluşundan bu yana evrensel ölçekte bilim ve proje üretmeyi başarabilen yapısını devam ettirmektedir. Üniversitemizde 5 Fakülte, 9 Enstitü olmak üzere toplam 14 akademik birim bulunmakta olup (21/10/2014 tarihli ve 6562 sayılı “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile kurulan Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü’nde kadro ve fiziksel yapılanma devam etmektedir ayrıca Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi 15.06.2020 tarih ve 2654 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile kurulmuş, henüz eğitim-öğretim faaliyetine başlamamıştır.), 8 Enstitüde 76 lisansüstü (40 tezli yüksek lisans, 11 tezsiz yüksek lisans ve 25 doktora), 4 Fakültede ise 22 lisans programında eğitim verilmektedir. Üniversitemiz 1.380.268,98 m² alan üzerinde kurulu olup 137.702,96 m² kapalı mekâna ve 24.457 m² açık ve kapalı spor alanına sahiptir. Üniversitemizde 2020 Aralık ayı sonu itibariyle 669 akademik personel (115 Profesör, 56 Doçent, 117 Doktor Öğretim Üyesi, 104 Öğretim Görevlisi, 277 Araştırma Görevlisi, 9 Yabancı Uruklu Sözleşmeli Personel) , 300 idari personel, 102 sürekli işçi olmak üzere toplam 1080 personel bulunmakta olup 8403 öğrenciye eğitim-öğretim hizmeti vermektedir.

1.3. 2020 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

1.3.1. Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi:

Bu proje kapsamında Üniversitemizde yürütülen yatırım projelerinin etüd-projeleri hazırlanmaktadır. Bu proje kapsamında 2020 yılında yapılan çalışmalar şunlardır;

- ✓ GTÜ Merkezi Derslik Binası Mimari Uygulama projeleri,
- ✓ SUMER (Su Merkezi Laboratuvarı) Binası Uygulama Projeleri,
- ✓ Onarım ve Bakım kapsamında gerekli mekânsal projeler hazırlanmıştır.

1.3.2. Kampüs Altyapısı Projesi:

Üniversite Kampüsünde yapılan yatırımların ve daha sonraki yıllarda ihtiyaçlar çerçevesinde yapılması planlanan yatırımların altyapı çalışmaları (içme suyu, enerji, doğalgaz, telefon, sinyalizasyon, yol, kanalizasyon ve yağmur suyu kanalları) uygulama yılı yatırım ödenekleri çerçevesinde yürütülmektedir.

Kampüs Alanımızın, 172.502,17 m² bölümü 19.02.2018 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile (Karar sayısı: 2018/11420) “Gebze Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi” olarak tespit edilmiştir. Bu alanda kurulan Yönetici Şirket ilgili kanun çerçevesinde faaliyetlerine başlamıştır. Ayrıca Üniversitemizin büyük gereksinim duyduğu yurt binalarına yönelik Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Defterdarlığa Üniversitemize tahsisli arazi içinden muvafakat verilmek sureti ile yaklaşık 39.500 m² alan devredilmiştir. Böylece gerek terk ve muvafakatlar gerekse TGB alanı ilanı sonrası güncel Çayırova Merkez Kampüs Alanımız 1.380.268,98 m² olup tamamı tahsislidir 2020 Yılında; Kampüs Altyapı Faaliyetleri çerçevesinde:

- ✓ Master Planımız ve beliren ihtiyaçlar çerçevesinde altyapı işleri yapılmıştır.
- ✓ Kampüs Master planı çerçevesinde rekreatif bazı düzenlemeler ve peyzaj çalışmaları yapılmıştır.
- ✓ Yeni Bina ve tadilat geçiren binalara yönelik altyapı yenilemeleri yapılmış ve yapılmaktadır.

- ✓ Kampüsümüz yaklaşım ve kampüs içi bilgi-yönlendirme tabelaları her yıl yaptırılmakta veya yenilenmektedir.
- ✓ Engelsiz Kampüs teması ile Engelli öğrenci ve personelimize yönelik çalışmalar yaptırılmaktadır.
- ✓ Kampüs içi yollarda tadilat yapılmaktadır.
- ✓ Altyapıya yönelik yenileme iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır. Artan kapalı alan miktarımız bunu zorunlu kılmaktadır. Öyle ki, 2015 yılı başında 77.000 m² mertebesinde olan kapalı alan toplamımız, hali hazırda tamamlanıp hizmete alınan binalar sonrası 137.702,96 m² mertebesine ulaşmış olup, 2021 yılı sonunda bu toplam yaklaşık 150.000 m² şeklinde olacaktır.

1.3.3. Derslik ve Merkezi Birimler Yatırım Projesi:

Üniversite Kampüsünde Derslik ve Merkezi Birimler yatırım projesi kapsamında;

- ✓ GTÜ Kongre ve Kültür Merkezi İnşaatımız tamamlanmıştır.
- ✓ 11.300 m² (5.650+5.650) kapalı alana sahip 2 adet Enstitü Binamızın 2020 Yılı sonu itibariyle %74'lük kısmı tamamlanmış olup 2021 yılında inşaat tamamlanacaktır.
- ✓ 320 m² kapalı alana sahip SUMER (Su Merkezi Laboratuvarı) ihale edilerek inşaatı başlamış olup 2021 yılı ilk yarısı binamız tamamlanacaktır.

GTÜ Enstitü Binaları Yapım İşi



GTÜ SUMER Binası Yapım İşi



1.3.4. Muhtelif İşler Projesi:

Büyük Onarım: Bu proje kapsamında, GTÜ Rektörlüğü Enstitü Bina Onarımı ve Açık Spor Tesisi Yapım İşi ile GTÜ Rektörlüğü P ve I2 Blokların Tadilat ve Onarımı Yapım İşi 2020 yılı içerisinde tamamlanmış olup GTÜ Çeşitli İşlerin Tadilat ve Onarımı İşi ise ihale edilmiş olup devam etmektedir. Bu işlerin yanı sıra kampüs genelinde periyodik bakımlar, onarım ve iyileştirme faaliyetleri özellikle derslik başta olmak üzere devam ettirilmiştir.

Kampüs içindeki Eğitim Öğretim ve Araştırma faaliyetlerinin kesintisiz olarak sürdürülebilmesi için gerek kampüs genelinde gerekse kampüs içi mekanlarda beliren eksikliklerin giderilmesi, çözümler üretilmesi, gerekli bakım onarım işlemlerinin yapılması gibi genel işleyişe ait gelişme ve zorunluluklar bu kalemdeki yol haritasını belirlemektedir.

Bu kapsamda önce sözleşme dahilindeki Bakım Onarım hizmetleri özetlenebilir. Kampüs içi işleyişin sürekliliği ve verimi için; asansörler, klimalar, jeneratörler, kazan ve brülörler, kesintisiz güç kaynakları, vakum gaz tesisatları, pompa, hidrofor, dizel grupları, özel odalar, su arıtma sistemleri, vrv sistem klimalar, split klimalar, yangın ihbar sistemleri için ayrı ayrı teknik sözleşmeler çerçevesinde bakım hizmetleri alınmaktadır. Ayrıca periyodik bakımlar veya arızalar sonucu ortaya çıkan Yedek Parça temini ve montajı da bu proje aracılığı ile gerçekleştirilmektedir.

Büyük Onarımlar kalemi bütçesi içerisinde öncelikle Bakım Onarım işleri yapılmaktadır. Kampüs genelinde, çevre düzenleme ve peyzaj işleri, güvenlik, kamera,

aydınlatma dekorasyon, bina iyileştirilmesine yönelik, boya, badana, yalıtım vb. inşaat imalatları, mekanik ve elektrik işleri, altyapı işleri, pvc-alüminyum doğrama, demir ve çelik imalatlar, taş, mermer, granit uygulamalar, otomatik kapı sistemleri, tabela imalatları vb. birçok iş kalemi değişik yüklenici firmalara “Doğrudan Temin” yöntemi ile yaptırılmıştır, Bu kapsamda genel bir ifade ile;


✓ Kurum içi Mekanik ve Elektriksel Bakım Onarım Sözleşmeleri yapılmak sureti ile asansör, ups, jeneratör, kazan, klima vb. cihaz ve sistemlerin periyodik bakımları yapılmış, eksiklikleri giderilmiştir.

✓ Mekân iyileştirme ve yenileme anlamında, kurumun ahşap dekorasyon, demir doğrama, ferforje veya çelik konstrüksiyon, yalıtım vb. işleri yaptırılmaktadır.

✓ Üniversitemiz işleyişinde beliren Elektrik ve Mekanik ihtiyaçlar, projelendirilip keşiflendirilerek giderilmiş/giderilmektedir.

GTÜ 4 Nolu Enstitü Bina Onarımı

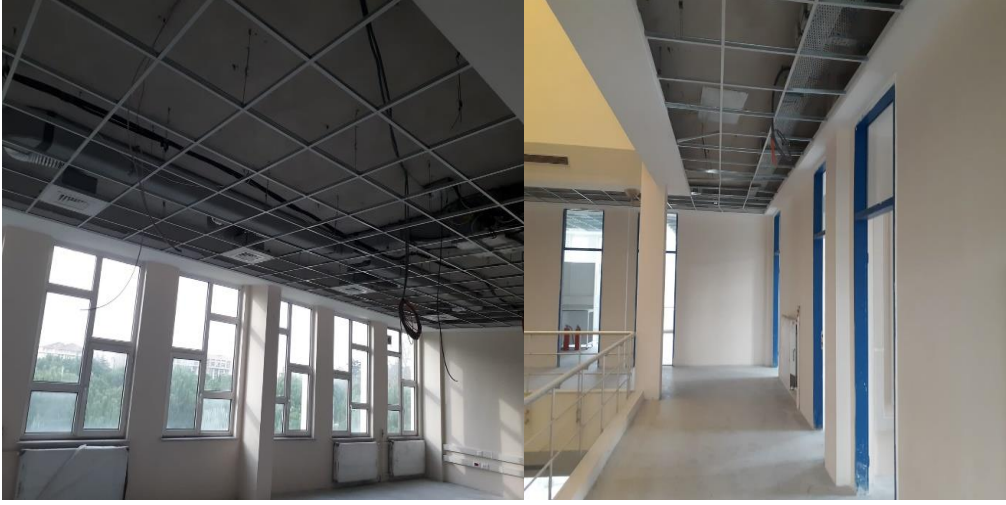

GTÜ Rektörlüğü P ve I2 Bloklarının Tadilat ve Onarım Yapım İşİ

Bilgi Teknolojileri: Bu proje kapsamında 2020 yılında yazılım, donanım ve hizmet alımları çerçevesinde yapılan çalışmalar şunlardır;

Yazılım Alımları:

- ✓ *Antivirüs Yazılımı:* Üniversitenin BT sistemlerinde ve son kullanıcıların bilgisayarında kullanılmak üzere Kaspersky antivirus yazılımı satın alınmıştır. Bu yazılım ile birlikte BT sistemleri ve son kullanıcı bilgisayarların virüs ve zararlı yazılımlara korunmuştur
- ✓ *Sınav Uygulama Yazılımı:* Türkçe bölümü için öğrencilerin sınav yapılması ve değerlendirilmesinde kullanılmak üzere sınav yazılımı alınmış ve ilgili birimin kullanımına sunulmuştur.
- ✓ *Personel Özlük Yazılımı:* Personel Dairesi Başkanlığının kullanması için personel özlük işleri yazılımı alınmış ve kullanıma sunulmuştur.
- ✓ *E-İmza Sertifikası Alımı:* Elektronik belge yönetim sisteminde kullanılması için personellerimize e-imza sertifikası alınmıştır. Mayıs 2020 tarihinden itibaren personel kendisi karşılamaktadır.
- ✓ *Logsign:* Sistem kayıtlarının tutulması için alınmıştır.

- ✓ *Microsoft Lisans Anlaşması:* Kampüs bünyesinde kullanılmak üzere Microsoft Lisans İhalesine çıkılmış ve satın alma işlemi yapılmıştır.

Donanım Alımları:

- ✓ *Bilgisayar, Yazıcı, Projeksiyon:* Üniversitenin idari ve akademik personelinin bilgisayar ve yazıcı ihtiyaçlarının karşılanması için bilgisayar ve yazıcı satın alınmıştır. Ayrıca üniversitenin ortak kullanımında bulunan laboratuvar ve sınıflar için bilgisayar, yazıcı ve projeksiyon cihazlarını alımı yapılmış olup kullanıma sunulmuştur.
- ✓ *Sunucu, Veri Depolama:* Üniversitenin bilgi işlem alt yapısını oluşturan sistemlerin performans ve kapasite artırımları için ram disk ve disk çekmeceleri satın alınmıştır. Alınan bu donanımlar mevcut sisteme bütünleştirilerek hizmetlerin sürekliliği sağlanmıştır. Ayrıca Felaket Merkezi için iki sunucu bir adet veri depolama cihazı satın alınmıştır.
- ✓ *Ağ Cihazları:* Üniversitenin BT yapısını oluşturan sistemlerin ve son kullanıcı cihazlarını bir birlerine bağlayan ağ topolojisine ilave switch, tranciever ve sfp modülleri satın alınmıştır.
- ✓ *Ebys Donanımları:* EBYS kullanıcıların elektronik imza kullanabilmeleri için sisteme ait donanım ve sertifikalar satın alınmış olup yönetim tarafında belirlenen kullanıcılara verilmiştir.

Hizmet Alımları

- ✓ *Sistem İzleme Hizmet Alımı:* Üniversite bünyesindeki IT hizmetlerin çalıştığı sistemlerin izlenmesi için yazılım satın alınmıştır. Satın alınan bu yazılım ile sistem odasında bulunan cihazların ve sunucuların takibi yapılmaktadır.

- ✓ *EBYS Yıllık Bakım ve Revizyon Hizmeti:* Üniversite bünyesinde kullanılan Elektronik Belge Yönetim Sisteminin yazılım destek ve bakım hizmeti satın alınmıştır. Bu alım ile birlikte iş sürekliliği kapsamında EBYS hizmeti verilmeye devam edilmiştir.
- ✓ *Amp Hakediş Yazılımı Güncelleme:* Yapı işleri hakediş işlemlerini gerçekleştirmek için AMP hakediş yazılımı alınmış olup 2019 yılında kullanıma sunulmuş ve 2020 Yılında da bir sonraki 2021 yılı için revizyon ve güncellemesi yapılmıştır.
- ✓ *EBYS Entegrasyon Hizmetleri:* Üniversite bünyesinde kullanılan Elektronik Belge Yönetim Sistemini ile Personel Özlük İşleri yazılımı bütünleştirilmesinin sağlanması için yazılım hizmet alımı yapılmış ve yazılımların karşılıklı veri transferleri sağlanmıştır. Ayrıca EBYS ile Öğrenci İşleri programı da entegre edilmiştir.
- ✓ *Sistem Odası İzleme Hizmet Alımı:* Üniversite bünyesindeki IT hizmetlerin çalıştığı sistemlerin izlenmesi için ortam izleme sistemi satın alınmıştır. Satın alınan bu sistemlerle birlikte sistem odasında bulunan ortam koşulları denetlenmektedir.
- ✓ *Uzaktan Eğitim Sistemi:* Mart ayından itibaren derslerin sanal ortamda yapılabilmesi için uzaktan eğitim sistemi kurulmuştur.
- ✓ *ANSYS Yıllık Bakım ve Revizyon Hizmeti:* Mühendislik Fakültesi, ANYS Academic Multiphysics Campus Solution.
- ✓ *Pfsense Kurulum Hizmeti:* Açık kaynak kodlu Firewall kurulum ve danışmanlık hizmeti.
- ✓ *KVKK Uyum ve Danışmanlık Hizmeti:* 27001 Danışmanlık hizmeti ve Penetrasyon sızma testi hizmetleri.
- ✓ *Bilgi ve İletişim Güvenliği Eğitim ve Danışmanlık Hizmeti:* Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi kriterleri kapsamında Bilgi ve İletişim güvenliği konusunda eğitim ve danışmanlık hizmeti.
- ✓ *Personel Özlük Programı Yıllık Bakım ve Revizyon:* Personel Daire Başkanlığının kullanması için alınan personel özlük işleri yazılımının 2021 Yılı bakım, destek ve revizyon hizmeti.

- ✓ *Mimari ve Betonarme (İdeCad) Programı Yıllık Bakım ve Revizyon:* Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı bünyesinde kullanılmakta olan (İdecad) programının modül güncelleme ve revizyon ve destek hizmeti.

Makine ve Teçhizat Alımı: 2020 yılı içinde laboratuvarlarda kullanılmak üzere cihazlar alınmış olup ayrıca mevcut ve yeni faaliyete geçen binalar ile ofislerin donanımı için de alım yapılmıştır.

1.3.5. Yayın Alımı Projesi:

Yayın alımı projesi kapsamında 24 adet elektronik veri tabanının aboneliği gerçekleştirilmiştir.

2020 Yılında Aboneliği Gerçekleştirilen Elektronik Yayınlar:

- ✓ ACM Digital Library
- ✓ American Chemical Society (ACS)
- ✓ American Institute of Physics (AIP)
- ✓ American Physical Society (APS) with PROLA
- ✓ American Society of Civil Engineers (ASCE)
- ✓ ASME (American Society for Mechanical Engineers)
- ✓ Avery Index to Architectural Periodicals
- ✓ Britannica Online
- ✓ DeepKnowledge
- ✓ Ebook Central
- ✓ EDS (EBSCODISCOVERY)
- ✓ EndNote
- ✓ Institute of Physics (IOP)
- ✓ İdealOnline
- ✓ Jove
- ✓ Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology
- ✓ MathSciNet

- ✓ Oxford Reference Online (ORO)
- ✓ Pnas(Proceedings of The National Academy of Sciences of the United States of America)
- ✓ ProQuest Business Collection
- ✓ Royal Society of Chemistry
- ✓ Science Online
- ✓ SciFinder
- ✓ The Cambridge Crystallographic Data Centre

1.4. 2020 Yılı Yatırım Uygulamaları

1.4.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu

✓ Toplam Proje Sayısı (Adet).....:	5
✓ Toplam Proje Tutarı (Bin TL).....:	84.868
✓ 2019 Yılısonu Kümülatif Harcaması (Bin TL)....:	41.318
✓ 2020 Yılı Başlangıç Ödeneği Toplam (Bin TL).:	21.500
✓ 2020 Yılısonu Ödeneği Toplam (Bin TL).....:	25.184
✓ 2020 Yılı Toplam Harcama (Bin TL).....:	24.914

2020 yılında 06 - Sermaye Giderlerine 21.500.000,00 TL bütçe ödeneği tefrik edilmiştir. Yıl içinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 3.683.708 TL yatırımları hızlandırma ödeneğinden ödenek aktarması yapılmıştır. Yılısonu itibarıyla oluşan toplam 25.183.708,00 TL ödeneğin 24.914.298,54 TL'si harcanmıştır. Yılısonu itibarıyla toplamda % 98,93 oranında harcama / ödenek gerçekleşmesi sağlanmıştır.

2. 2020 Yılı Proje Uygulamaları

2.1. Devam Eden Projeler:

2.1.1. 2020H03150808 – Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi:

Projenin başlangıç ödeneği 100.000,00 TL'dir. Yılsonu itibarıyla ödeneğin 99.902,10 TL'si harcanmıştır. Harcamanın toplam ödeneğe oranı % 99,91'dir.

2.1.2. 2020H03150840 – Kampüs Altyapısı:

Projenin başlangıç ödeneği 1.400.000,00 TL'dir. Yılsonu itibarıyla ödeneğin tamamı harcanmıştır. Harcamanın toplam ödeneğe oranı % 100'dür.

2.1.3. 2008H03928 – Derslik ve Merkezi Birimler:

Projenin başlangıç ödeneği 9.002.000,00 TL'dir. Yıl içinde 2020H03150851 nolu Muhtelif İşler Projesinden 2.898.000,00 TL, 2020H03150812 Yayın Alımları Projesinden 800.000,00 TL projeler arası aktarma ile ödenek aktarması yapılmıştır. Yıl içinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yatırımları hızlandırma ödeneğinden 600.000,00 TL ödenek eklenmiştir.

Yılsonu itibarıyla oluşan toplam 13.300.000,00 TL ödeneğin 13.131.392,33 TL'si harcanmıştır. Harcamanın toplam ödeneğe oranı % 97,74 dür.

2.1.4. 2020H03150851 – Muhtelif İşler:

Projenin bütçe başlangıç ödeneği:

- ✓ Büyük Onarım – 5.898.000,00 TL
- ✓ Makine ve Teçhizat Alımı – 1.000.000,00 TL
- ✓ Bilgi Teknolojileri – 1.000.000,00 TL

olmak üzere toplam 7.898.000,00 TL'dir. Büyük Onarım alt projesinden 2008H03928 nolu Derslik ve Merkezi Birimler projesine 2.898.000 TL, Makine ve Teçhizat alımı Alt projesinden ise 10.000 TL Bilgi Teknolojileri alt Projesine aktarma yapılmıştır. Yıl içinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından Bilgi Teknolojileri alt projesine

870.000,00 TL ile Makine Teçhizat alt projesine 2.213.708 TL yatırımları hızlandırma ödeneğinden ödenek aktarması ile ekleme yapılmıştır. Yılsonu itibarıyla oluşan toplam 8.083.708 TL ödeneğin 7.983.484,02 TL'si kullanılmıştır. Harcamanın toplam ödeneğe oranı % 98,76'dır.

Muhtelif İşler Projesi	Yılsonu Toplam Ödenek	Yılsonu Harcama
Büyük Onarım	3.000.000,00	2.999.907,18
Makine ve Teçhizat Alımı	3.203.708,00	3.202.950,44
Bilgi Teknolojileri	1.880.000,00	1.780.626,40
TOPLAM	8.083.708,00	7.983.484,02

2.1.5. 2020H03150812 – Yayın Alımı:

Projenin başlangıç ödeneği 2.500.000,00 TL olup yıl içinde 2008H03928 nolu Derslik ve Merkezi Birimler Projesine 800.000,00 TL ödenek aktarılmıştır.

Yılsonu itibarıyla oluşan 1.700.000,00 TL ödeneğin 1.699.520,09 TL'lik kısmı kullanılmıştır. Harcamanın toplam ödeneğe oranı % 99,98'dir.

3. Öneriler:

- ✓ Kurum yatırım projeleri toplam bütçesi tavan rakamlarının belirlenmesinde kurum ihtiyacının dikkate alınması,
- ✓ Doğrudan temin ve pazarlık usulü limitlerinin yükseltilmesi,
- ✓ Proje ödeneklerinin aylık dağılımının kurum ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmesi,
- ✓ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 21 ve 22. maddelerindeki parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamının idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin %10'u ile sınırlandırılmaması,
- ✓ Aşırı düşük teklif sorgulama sürecinin ve mevzuatının idarelerin yükünü hafifletecek şekilde yeniden düzenlenmesi önerilmektedir.

2020 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2019 Sonu Kümülatif Harcama			2020 Yılı Program Ödenek			2020 Yılı Revize Ödenek			2020 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.- Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	5		84.868			41.318			21.500			25.184			24.914
Sağlık															
D.Kamu Hizm.															
-İktisadi															
-Sosyal															
TOPLAM	5		84.868			41.318			21.500			25.184			24.914

2020 YILI HARCAMALARI IV. DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU

Sektörü: Eğitim

2020 IV. Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi

(1.000 TL)

Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış(8)	Proje Tut. Toplam (9)	2019 Kümülatif Harcama(10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak(12)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Aktarma Mikt.(15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)	Harcama Toplam (18)
2020H03150840	Kampüs Altyapısı	ÖZEL BÜTÇE	2022,	Kocaeli-Gebze	0,	7.900,	0,	0,	0,	2.000,					2.000,
2008H03928	Derslik ve Merkezi Birimler	ÖZEL BÜTÇE	2022,	Kocaeli-Gebze	0,	66.470,	41.318,	0,	0,	9.002,	(+)	4.298,			13.131,
2020H03150808	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2020,	Kocaeli-Gebze	0,	100,	0,	0,	0,	100,					100,
2020H03150851	Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2020,	Kocaeli-Gebze	0,	7.898,	0,	0,	0,	7.898,	(+)	186,			7.983,
	Taahhüt Hibesi									(0)					
2020H03150812	Yayın Alımı	ÖZEL BÜTÇE	2020,	Kocaeli-Gebze	0,	2.500,	0,	0,	0,	2.500,	(-)	800,			1.700,
TOPLAM					0,	84.868,	41.318,	0,	0,	21.500,		3.684,			24.914,
